



H. Ciudad Juárez, Chih., a 7 de enero 2021  
Oficio No. 012/21 Rectoría  
Asunto: Informe trimestral (4<sup>to</sup> Trimestre 2020) FAM 2020

**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
**Director de Fortalecimiento Institucional**  
**Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural**  
**P r e s e n t e . –**

Estimado Dr. Elizarraraz:

En atención al oficio No. 511/2020.- 0845-13, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020, correspondiente al cuarto trimestre del 2020.

La versión electrónica del citado informe ha sido remitida previamente a las siguientes direcciones electrónicas:

- [isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx](mailto:isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx)
- [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx)
- [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx)

Sin otro particular, me permito reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

**Atentamente**

**Por una vida científica  
por una ciencia vital**



**MTRO. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR**  
**Rector**

c.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo,  
Subdirectora de Fomento Institucional.  
DGPDI/SPO/\*liba

*Rectoría*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ**

2020



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado:  
**4to Trim 2020**

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 011: 08MSU0245B-115

RESPONSABLES

**Planeación**  
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado  
Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional  
Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36  
Correo electrónico: mmears@uacj.mx

**Obras y Mantenimiento**  
Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes  
Cargo: Director General de Servicios Administrativos  
Teléfono: (656) 688-21-40  
Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Obra de construcción	Equipamiento	Adiciones y mejoras				Mantenimiento	Proyecto sustentable	Espacio/equipo				Cantidad	metros cuadrados			Inicio	Termino	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuenta con acta de inauguración?
1	Adecuaciones y Mejoras del Edificio " D" del Instituto de Ingeniería y Tecnología	X			\$ 23,155,150.00	\$ 15,706,881.24	\$ 7,448,268.76	Aulas: 14, 932.00 Oficinas académicas: 13, 177.50 Oficinas administrativas: 5, 176.10 Sanitarios: 6, 80.16 Áreas comunes: 15, 769.00	Muros de block, aplastados exteriores, colocación de piso de cerámica, muros de Tablaroca, muros de Durock, pintura, textura impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias, ductos de clima, cableado eléctrico, colocación de cancelería interna y exterior, terraplén de obra exterior	n/a	70.00%	21-07-20	29-02-21	En este periodo se ejecutaron las partidas: excavaciones y terracerías, albanilería, muros y plafones, acabados, vidrios y cancelas, impermeabilización, instalaciones hidráulicas, eléctricas, voz y datos, clima, obra exterior.							
					<b>\$23,155,150.00</b>	<b>\$15,706,881.24</b>	<b>\$7,448,268.76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2134.76</b>												

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Procedimiento de entrega

70

1 Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras del Edificio D del Instituto de Ingeniería y Tecnología**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

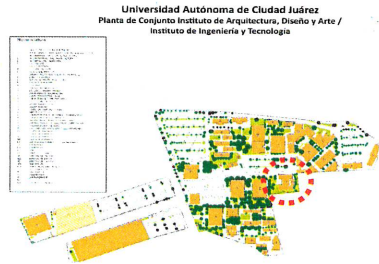

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
Planta de Conjunto Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte /  
Instituto de Ingeniería y Tecnología

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio D, Campus IIT, Av. del Charro no. 450 Nte. Col. Partido Romero CP 32310.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se trabaja en muro de fachada posterior, aplanados exteriores, colocación de piso de cerámica, muros de Tablaroca, muros de Durock, pintura, textura, cancelería interior y exterior, instalaciones eléctricas, voz y datos, ductos de clima, instalación hidrosanitaria, terraplén en obra exterior.



F3: Azotea



F4: Interior



F6: Aula

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
