



Ciudad Juárez, Chih., a 8 de octubre 2020
Oficio núm. 357/20 Planeación
Asunto: Informe trimestral (3^{er} Trimestre 2020) FAM 2020

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
Director de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
P r e s e n t e.-

En atención al oficio No. 511/2020.- 0845-13, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020, correspondiente al tercer trimestre del 2020.

La versión electrónica del citado informe ha sido remitida previamente a las siguientes direcciones electrónicas:

- isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx
- rocioc@nube.sep.gob.mx
- cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Agradeciendo de antemano la atención brindada al presente, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi consideración y estima distinguida.

A t e n t a m e n t e

**Por una vida científica
por una ciencia vital**



MTRO. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR
Rector

c.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo,
Subdirectora de Fomento Institucional.
archivo.
DGPD/SP/01liba

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

2020



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado:
3er Trim 2020
Enero 2020 - Marzo 2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B-115

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado

Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36

Correo electrónico: mmears@uacj.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Cargo: Director General de Servicios Administrativos

Teléfono: (656) 688-21-40

Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Llaves)	Si ya fue inaugurada					
		Obra de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuenta con video del evento?	Entrega Resguardo (acta final)	Acta de formalización de Entrega- Recepción	Monto de multa Administrativa
1	Adecuaciones y Mejoras del Edificio " D" del Instituto de Ingeniería y Tecnología	x				\$ 23,155,150.00	\$ 8,811,858.73	\$ 14,343,291.27	Aulas Oficinas académicas Oficinas administrativas Sanitarios Áreas comunes	2138.42		Demoliciones de cancelería, muros y pisos, retiro de instalaciones existentes, excavaciones para cimentación, cimbrado y armado de acero, colocación de sistemas de ductos de clima, colocación de tubería hidrosanitarias, colocación de tubería para iluminación interior, colado de firmes de concreto y sobre firmes.	Conclusión de estructura metálica y de concreto, albanilería, y muros y plafones e inicio de acabados, herrería, vidrio y cancelas, carpintería, impermeabilización, instalaciones, elevador y obra exterior.	12.00%	21-07-20	25-02-21	En este periodo se ejecutaron las partidas: preliminares, excavaciones, herrerías, cimentación, albanilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctrico y voz y datos.							
						\$23,155,150.00	\$8,811,858.73	\$14,343,291.27	TOTAL	2138.42														

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIAL

1

Nombre de la obra:


Adecuaciones y Mejoras del Edificio D del Instituto de Ingeniería y Tecnología




Porcentaje de avance

12

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

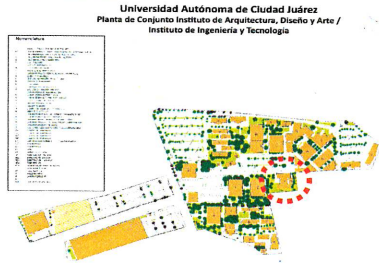

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Planta de Conjunto Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte /
Instituto de Ingeniería y Tecnología

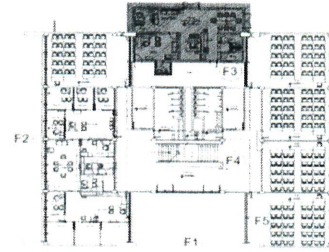

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio D, Campus IIT, Av. del Charro no. 450 Nte. Col. Partido Romero CP 32310.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se trabaja en excavaciones, trabajos de compactaciones en cepas para cimentación, armado de acero, cimbrado de zapatas aisladas, instalación de tuberías hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, trabajos de albañilería, estructura para muros de tablaroca, renivelado de pisos planta alta, etc.



F3: Azotea

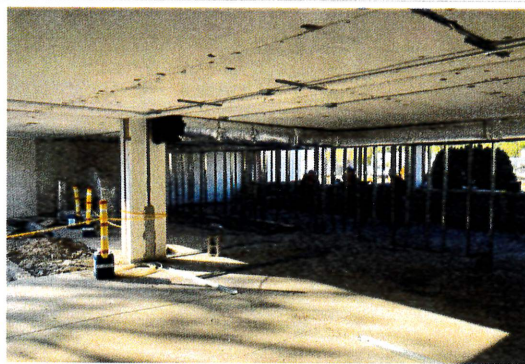

F4: Interior



F5: Aula

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
