



Ciudad Juárez, Chih., a 7 de octubre de 2019.
Oficio No 328– Rectoría / Planeación.
Asunto: Informe mensual (septiembre) FAM 2019.

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Presente. -

En atención al oficio No. 511/2019.- 0275, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, correspondiente al mes de septiembre del 2019.

La versión electrónica del citado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx,

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi consideración y estima distinguida.

Atentamente

“POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL”



Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Ccp: Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.

Mmears/liba

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Av. Plutarco Elías Calles 1210 • Fovissste Chamizal • C. P. 32310 • A. P. 100 • Ciudad Juárez, Chih., México
Teléfonos: (656) 688 2110 y 688 2111 • Fax (656) 688 2118 • P. O. Box 10307 • El Paso, Texas 79994

2019
AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre_2019
FECHA DE CORTE: 30/09/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Entidad federativa: Chihuahua
Clave Inst 911: 08MSU0245B



RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Mtra. Ma. Esther Meers Delgado
Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36
Correo electrónico: mmeers@uacj.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Cargo: Director General de Servicios Administrativos
Teléfono: (656) 688-21-40
Correo electrónico: gesando@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹		Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas
						Espacio/equipo	cantidad metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con los datos del evento?	¿Quien y cuando se realizó el Acta Inauguración (Iniquito)?	
1	Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Obra de continuidad	\$ 17,268,254.09	\$ 13,029,551.23	\$ 4,238,702.86	Aulas Auditorio Oficinas académicas Oficinas administrativas Sanitarios Áreas comunes	16 1 4 3 2 2	1063.17 120.00 200.00 150.00 150.00 350.00	Unidades de clima, pintura en muros, colocación de sistemas de ductos, aplinado de muros perimetrales, tubería hidrosanitaria, salidas eléctricas, salidas de comunicación, tableros eléctricos y fabricación de cancelería	n/a	52.8	14-06-19	15/12/2019	En este periodo se ejecutaron las partidas: clima, pintura, lesta, instalaciones eléctricas y voz y datos			
			\$ 17,268,254.09	\$ 13,029,551.23	\$ 4,238,702.86	TOTAL	28	2033.17									

OBRA CONCLUIDA

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado
Septiembre_2019
FECHA DE COATEO



Porcentaje de avance


52.8

1


Nombre de la obra:

Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)

CROQUIS DE LOCALIZACION

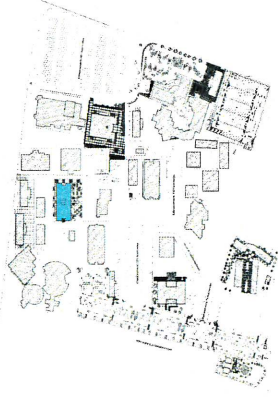

Plano de Conjunto

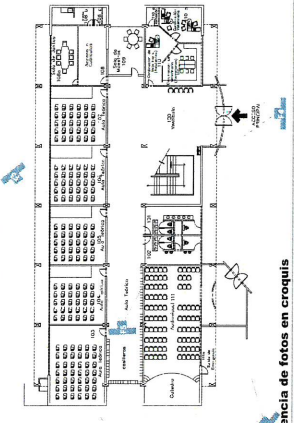


Referencia de fotos en croquis


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio D, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamin Franklin 4651

FOTOS

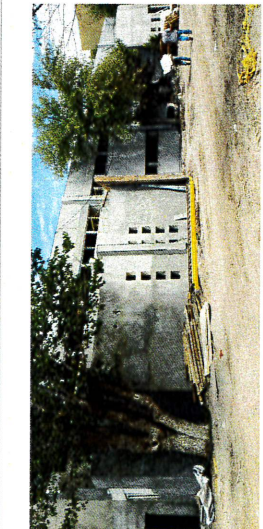


F1: Fachada posterior

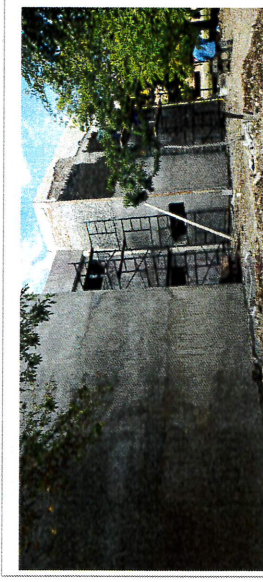


F2: lateral



F3: Fachada anterior



F4: Entrada

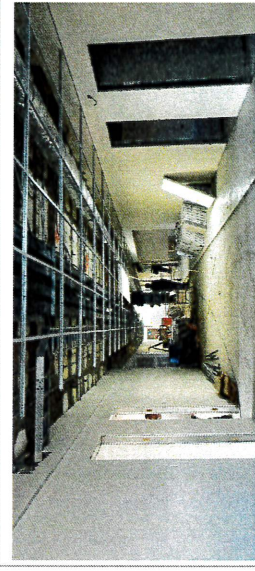

F5: Interior de aula 1

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realiza instalación de unidades de clima, se trabaja en fabricación de plafón reticular, se trabaja en instalación de loseta de cerámica en pisos, se trabaja en primera mano de pintura en muros interiores, se trabaja en cableado de salidas eléctricas y de comunicación.

Mtro. Juan Ignacio Camarco Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pesetaña, se podrán copiar tantas pesetañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
