



Ciudad Juárez, Chih., a 3 de mayo de 2019.  
Oficio No. 127– Rectoría / Planeación.  
Asunto: Informe mensual (abril) FAM 2019.

**Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz**  
**Director de Fortalecimiento Institucional**  
**Presente. -**

En atención al oficio No. 511/2019.- 0275, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, correspondiente al mes de abril del 2019.

La versión electrónica del citado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

[isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx](mailto:isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx), [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx),  
[cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx),

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi consideración y estima distinguida.

**Atentamente**

“POR UNA VIDA CIENTÍFICA,  
POR UNA CIENCIA VITAL”

  
**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
**Rector**

Ccp: Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.

Mmears/liba

*Rectoría*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ**

Av. Plutarco Elías Calles 1210 • Fovissste Chamizal • C. P. 32310 • A. P. 100 • Ciudad Juárez, Chih., México  
Teléfonos: (656) 688 2110 y 688 2111 • Fax (656) 688 2118 • P. O. Box 10307 • El Paso, Texas 79994

2019

Mes reportado

**Abril\_2019**

FECHA DE CORTE: 30/04/19

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIA

1


Nombre de la obra: **Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)**




Porcentaje de avance

0

Planta de Conjunto

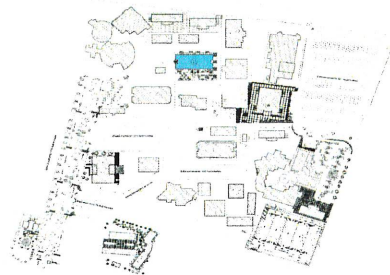

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio D, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamín Franklin 4651

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Las imágenes corresponden al estado actual en la que se encuentra la obra a realizar.



F3: Fachada posterior

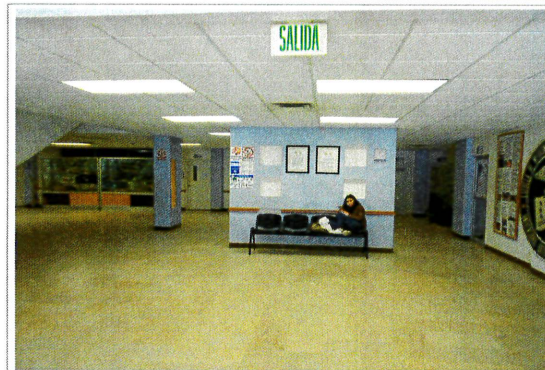

F4: Entrada



F5: Interior de aula 1

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Mes reportado

**Abril 2019**

FECHA DE CORTE: 30/04/19

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B

**RESPONSABLES**

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado	Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional	Cargo: Director General de Servicios Administrativos
Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36	Teléfono: (656) 688-21-40
Correo electrónico: mmears@uacj.mx	Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adedicaciones y mejoras				Mantenimiento	Proyecto sustentable	Espacio/equipo				cantidad	metros cuadrados			Inicio	Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuando inauguró?	Entrega- Recepcion (Acta finiquito)
1	Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	x			\$ 17,268,254.09	\$ -	\$ 17,268,254.09	Aulas	16	1063.17	•Se encuentra en proceso de gestión del recurso ante Gobierno del Estado de Chihuahua	•Licitación de la obra •Dar inicio formal a los trabajos de remodelación	0	24/06/2019	15/12/2019	S/O						
							Auditorio	1	120.00													
							Oficinas académicas	4	200.00													
							Oficinas administrativas	3	150.00													
							Sanitarios	2	150.00													
							Áreas comunes	2	350.00													
							<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>2033.17</b>													
					\$17,268,254.09	\$0.00	\$17,268,254.09															

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
